

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 24 期

校园建设处

2022 年 7 月 25 日

一、本周现场情况

1. I-1 段首层模板施工完成；
2. I-1 段首层大梁钢筋绑扎完成；
3. I-2 段首层竖向钢筋绑扎完成 50%；
4. I-2 段首层顶板支撑体系完成 35%；
5. I-3 段地下室顶板梁钢筋绑扎完成；
6. I-3 段地下室混凝土浇筑完成；
7. I-4 段首层内支撑搭设完成 60%；
8. I-4 段地下室顶板支模完成；
9. I-4 段地下室地下室顶板、梁钢筋绑扎完成 85%；
10. II-1 段首层顶板模板支设完成；
11. II-2 段首层顶板支撑体系施工完成；
12. II-2 段首层竖向钢筋绑扎完成；
13. II-3 段首层内支撑搭设完成 90%；
14. II-3 段地下室顶板梁钢筋绑扎完成；
15. II-3 段地下室顶板混凝土浇筑完成；
16. II-4 段地下室竖向墙体模板支设完成；
17. II-4 段地下室竖向墙、柱混凝土浇筑完成；
18. II-4 段地下室顶板支撑、模板支设完成；
19. II-6 段首层内支撑搭设完成 75%。

二、下周工作计划

1. I-1 段首层结构施工完成；
2. I-2 段首层顶板模板、大梁钢筋绑扎完成；
3. I-2 段首层竖向钢筋绑扎完成；
4. I-3 段首层内支撑搭设完成；
5. I-4 段地下室顶板、梁钢筋绑扎完成；
6. I-4 段首层顶板模板支设完成 90%；
7. I-4 段地下室顶板、梁钢筋绑扎完成；
8. I-4 段地下室顶板混凝土浇筑完成；
9. I-5 段首层内支撑搭设完成 50%；
10. II-1 段首层结构施工完成；
11. II-2 段首层顶板模板支设完成；
12. II-2 段首层大梁钢筋绑扎完成；
13. II-3 段首层内支撑搭设完成；
14. II-3 段首层顶板模板施工完成；
15. II-4 段地下室顶板钢筋、混凝土施工完成；
16. II-6 段首层内支撑搭设完成；
17. II-6 段首层顶板模板支设完成 80%。

三、本周协调工作情况

无。


四、本周主要大事记

1. 7 月 18 日，拱辰街道城管检查现场工作；
2. 7 月 20 日，黄先开书记带队进行现场慰问并检查现场工作；
3. 7 月 21 日，房山区劳动监察单位例行巡视检查。

五、现场检查及施工照片



黄书记带队进行现场慰问并检查现场工作

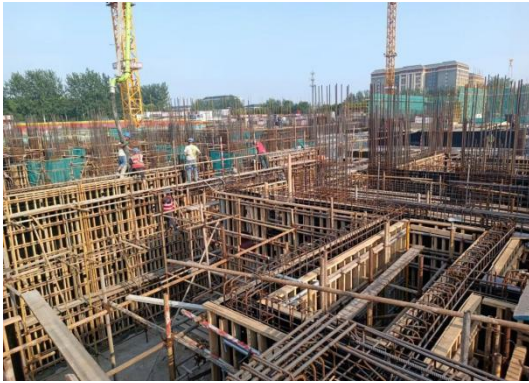

混凝土浇筑



钢筋绑扎验收
