

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 25 期

校园建设处

2022 年 8 月 1 日

一、本周现场情况

1. B-1 段首层结构施工完成；
2. B-2 段首层顶板模板、大梁钢筋绑扎完成；
3. B-3 段首层模板支设完成；
4. B-4 段首层顶板模板支设完成；
5. B-4 段首层竖向刚健绑扎完成；
6. B-5 段首层顶板模板施工完成；
7. A-1 段首层内支撑搭设完成；
8. A-1 段首层顶板模板支设完成；
9. A-2 段首层内支撑搭设完成；
10. A-4 段首层内支撑搭设完成；
11. A-6 段首层内支撑搭设完成；
12. A-6 段首层顶板模板施工完成 90%；
13. I-4 段地下室顶板、梁钢筋绑扎完成；
14. I-4 段地下室顶板混凝土浇筑完成；
15. II-4 段地下室顶板钢筋、混凝土施工完成；

二、下周工作计划

1. B-1 段二层内支撑施工完成；
2. B-2 段首层结构施工完成；
3. B-2 段二层内支撑完成 50%；
4. B-3 段首层结构施工完成 80%；

- 5. B-4 段首层结构施工完成；
- 6. B-5 段首层结构施工完成 75%；
- 7. A-1 段首层结构施工完成 80%；
- 8. A-2 段首层结构施工完成 70%；
- 9. A-3 段首层结构施工完成 60%；
- 10. A-4 段首层结构施工完成 50%；
- 11. A-5 段首层结构施工完成 50%；
- 12. A-6 段首层结构施工完成；


三、本周协调工作情况

无。

四、本周主要大事记

- 1. 7 月 25 日，管理公司正式进场；
- 2. 7 月 27 日，地下结构施工完成，出土 0；
- 3. 7 月 28 日，房山区行政执法队检查现场工作。

五、现场检查及施工照片

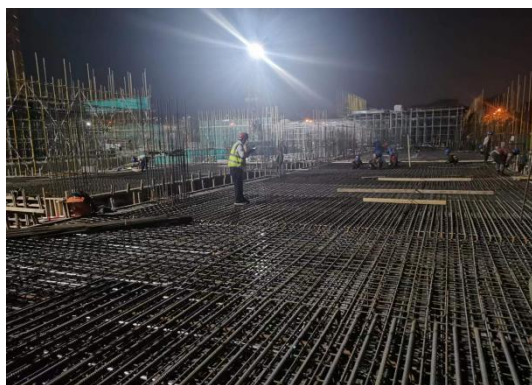

地下室顶板钢筋施工



地下室顶板混凝土施工



A 座首层施工
