

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 21 期

校园建设处

2022 年 7 月 4 日

一、本周现场情况

1. I-1 段首层竖向钢筋绑扎完成 90%;
2. I-1 段首层竖向支撑完成 70%;
3. I-2 段夹层顶板、剩余部分墙体混凝土施工完成;
4. I-2 段顶板模板支设完成 90%;
5. I-3 段竖向墙、柱模板支设完成 25%，累计完成 95%;
6. I-4 段独立柱混凝土浇筑完成;
7. I-4 段竖向墙体模板支设完成 20%;
8. II-2 段顶板支撑、模板支设完成;
9. II-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成 90%;
10. II-3 段墙体模板支设完成 30%;
11. II-4 段墙、柱钢筋绑扎完成;

二、下周工作计划

1. I-1 段首层竖向钢筋绑扎完成;
2. I-1 段首层顶板支撑体系完成;
3. I-2 段顶板模板完成;
4. I-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成 90%;
5. I-3 段竖向墙、柱模板完成;
6. I-3 段竖向墙体混凝土完成;

- 7. I-4 段竖向墙体模板完成 50%;
- 8. II-1 段首层顶板支撑体系完成 90%;
- 9. II-2 段顶板、梁钢筋绑扎完成;
- 10. II-2 段顶板、梁混凝土浇筑完成;
- 11. II-3 段墙体模板施工完成 60%;
- 12. II-4 段人防门框安装完成;

三、本周协调工作情况

无。


四、本周主要大事记

- 1. 6 月 30 日，房山区人社局现场检查工作；
- 2. 7 月 1 日，北京工商大学对项目进行综合安全检查；
- 3. 7 月 3 日，房山区安监站现场检查工作。

五、现场检查及施工照片



混凝土浇筑

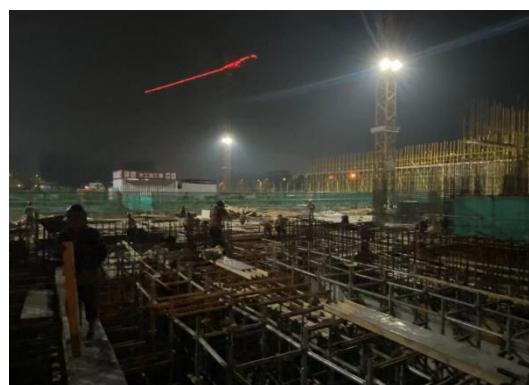

模板支设



顶板钢筋绑扎



综合安全检查
