

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2022 年第 46 期

校园建设处

2022 年 12 月 26 日

一、本周现场情况

1. A 座屋面结构施工完成 85%；
2. B 座屋面结构施工完成 95%；
3. 地下室内回填土完成 40%；
4. 钢结构主梁吊装完成；
5. 消防水池结构施工完成 20%。

二、下周工作计划

1. B-5 段屋面结构施工完成；
2. A-5 段屋面结构施工完成；
3. 地下室内土方回填完成 20%；
4. 消防水池基础底板浇筑完成；
5. 钢结构次梁、压型钢板安装完成 20%。

三、本周协调工作情况

无


四、本周主要大事记

1. 2022 年 12 月 19 日，区住建委组织召开施工工地复工复产工作部署会，传达上午市复工复产工作调度会工作要求；
2. 本周现场按照降噪管理方案严格落实各项降噪措施。

五、现场检查及施工照片



消防水池施工

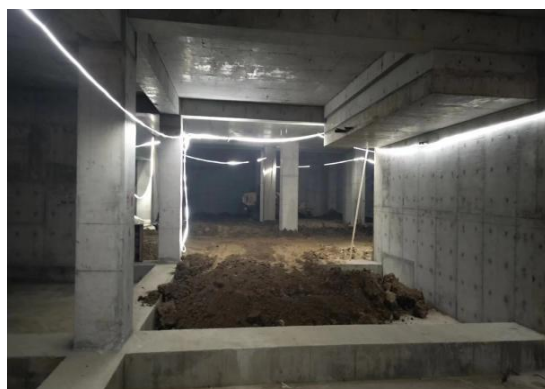

地下室内回填土施工



A 座屋面



B 座屋面
