

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 4 期

校园建设处

2023 年 2 月 20 日

---

### 一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道基础垫层施工完成；
2. A 座二次结构砌筑：二层、三层施工完成 50%，四层施工完成 10%；
3. B 座二次结构砌筑：二层施工完成 85%，三层施工完成 60%，四层、五层施工完成 30%；
4. 消防水池结构施工完成 70%；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装。

### 二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 420m<sup>3</sup>；B 座二次结构砌筑 550m<sup>3</sup>；
2. 东西两侧汽车坡道基础防水施工完成，保护层完成 80%；
3. 消防水池结构施工完成；
4. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装。

### 三、本周协调工作情况

无


### 四、本周主要大事记

1. 2023年2月15日，市住建委组织“起重机械安全管理”培训会；
2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

## 五、现场检查及施工照片



结构实体检测

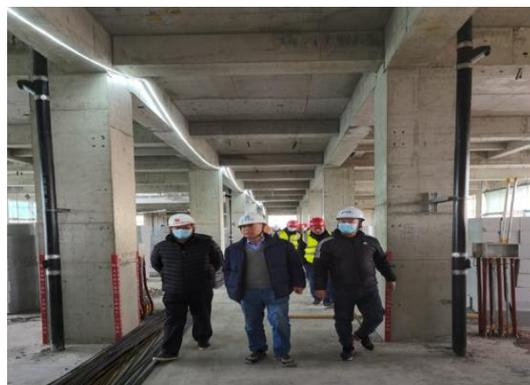


安全联合检查




临电安全检查



汽车坡道施工

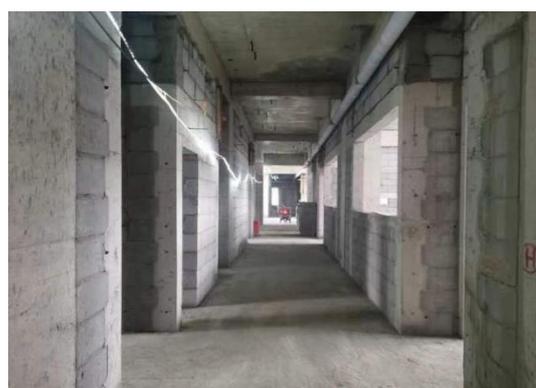

砌体结构施工

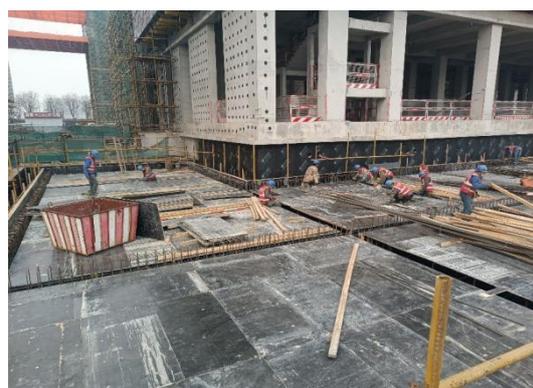

消防水池施工
