

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 3 期

校园建设处

2023 年 2 月 13 日

---

### 一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道土方开挖完成；
2. A 座二次结构砌筑：二层施工完成 60%，三层施工完成 50%；
3. B 座二次结构砌筑：二层施工完成 85%，三层施工完成 60%；
4. 消防水池结构施工完成 25%；

### 二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 350m<sup>3</sup>；B 座二次结构砌筑 550m<sup>3</sup>；
2. 东西两侧汽车坡道基础垫层施工完成 80%；
3. 消防水池结构施工完成 30%；
4. 陶土板幕墙现场测量放线施工；

### 三、本周协调工作情况

1. 2023 年 2 月 9 日，组织勘察及主体院设计、施工单位、监理单位对现场主体结构进行分部验收，区质量监督站参与监督，顺利通过验收；

### 四、本周主要大事记

1. 2023 年 2 月 6 日，区住建委组织建筑工地复工复产调度会议；
2. 2023 年 2 月 7 日，区住建委组织建筑工地复工复产专题会议；

3. 2023年2月9日，主体结构分部顺利通过验收；

4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

### 五、现场检查及施工照片



主体结构分部验收




复工前安全联合检查



临电安全检查



汽车坡道施工

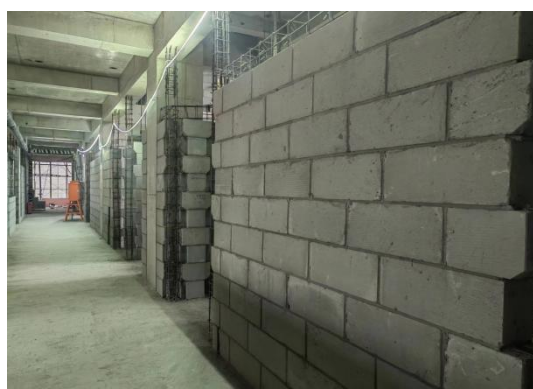

砌体结构施工



B座外侧现状
