

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 9 期

校园建设处

2023 年 3 月 27 日

一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道结构施工完成；
2. 二次结构砌筑：A 座施工完成 80%，B 座施工完成 85%；
3. 陶土板幕墙后置埋件打孔安装施工完成 15%；
4. 首层管沟防水施工完成 65%；汽车坡道外墙防水施工完成 50%；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，给排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 300m³，B 座二次结构砌筑 250m³；
2. 汽车坡道防水施工完成；
3. 二层卫生间样板施工完成；
4. 陶土板幕墙后置埋件打孔安装施工完成 20%；
5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 3 月 23 日，组织监理单位、施工单位查看学校已投入使用

的实验室，督促施工单位参考完善设计方案并及时组织会议讨论确认。

2. 2023年3月24日，组织设计单位、监理单位、施工单位召开现场技术问题推进会和室外管线接驳路由协调会议。

四、本周主要大事记

1. 2023年3月23日，组织监理单位、施工单位查看学校已投入使用的实验室，督促施工单位参考完善设计方案并及时组织会议讨论确认；

2. 2023年3月24日，组织设计单位、监理单位、施工单位召开现场技术问题推进会和室外管线接驳路由协调会议；

3. 2023年3月24日，组织设计单位、监理单位、施工单位查看现场走廊管线综合排布样板。


五、现场检查及施工照片



工程推进会议



走廊管线综合排布样板

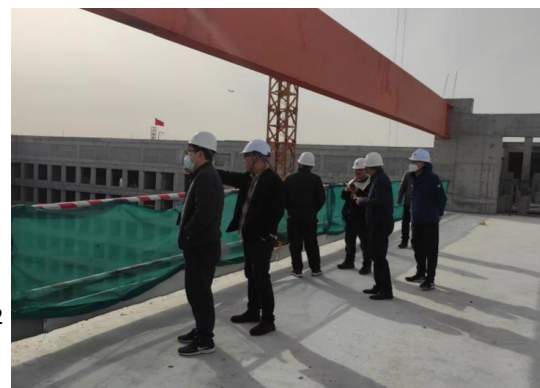

观摩实验室功能布局



安全联合检查

工程进度检查



二次结构砌筑
