

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 13 期

校园建设处

2023 年 4 月 24 日

一、本周现场情况

1. 地下室顶板卷材防水施工完成 20%；
2. 实验室地面垫层：B 座 4-7 层施工完成,3 层施工完成 50%；
A 座 3-5 层施工完成；
3. 陶土板幕墙龙骨现场加工完成 20%；
4. 卫生间样板施工完成 50%；
5. 屋面保温层施工完成 20%；
6. 机电专业同步进行强、弱电管线预留预埋，给排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. 地下室顶板卷材防水施工完成 40%，消防水池顶板防水卷材施工完成；
2. 屋面保温：A 座施工完成 60%，B 座施工完成 70%；
3. 地上二次结构：A 座首层施工完成 70%，B 座首层施工完成 50%；
4. 陶土板幕墙龙骨：A 座加工完成 30%，B 座龙骨进场 20%；
5. 实验室地面垫层：A 座 6-7 层施工完成；B 座 3 层施工完成；

6. 机电专业同步进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；

三、本周协调工作情况

1. 2023年4月18日，同房山区水务局排水事务中心沟通，推进校区AB座科研楼排水入网审查事宜；
2. 2023年4月19日，同北京市自来水集团良泉水业有限公司沟通，推进校区AB座科研楼供水事宜；

四、本周主要大事记

1. 2023年4月18日，同房山区水务局排水事务中心沟通，推进校区AB座科研楼排水入网审查事宜；
2. 2023年4月19日，同北京市自来水集团良泉水业有限公司沟通，推进校区AB座科研楼供水事宜；
3. 2023年4月20日，北京市专家组、房山区建委安监站对现场进行北京市绿色安全样板工地验收；
4. 2023年4月21日，同房山区安监局、消防、城管、拱辰街道及大学城管委会对施工现场联合进行安全生产隐患大排查大整治检查；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。


五、现场检查及施工照片



行管部门安全大检查



安全质量联合检查

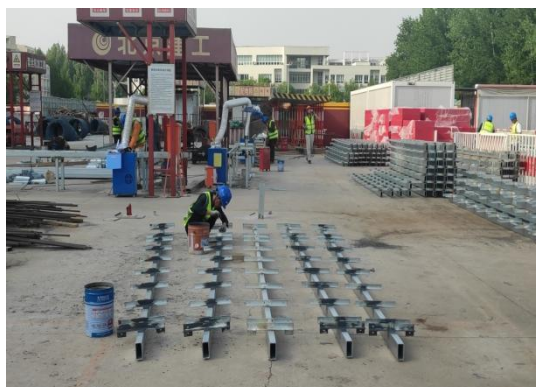

陶板幕墙龙骨加工



卫生间样板施工



地下室顶板防水



机电专业施工
