

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 11 期

校园建设处

2023 年 4 月 10 日

一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道外墙、顶板防水施工完成；
2. 二次结构砌筑：A 座施工完成 90%，B 座施工完成 90%；
3. 陶土板幕墙后置埋件打孔安装施工完成 70%；
4. 卫生间样板施工完成 30%；
5. 机电专业同步进行强、弱电管线预留预埋，给排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. 地下室顶板防水施工完成 20%；
2. 屋面工程施工完成 30%；
3. 二层卫生间样板施工完成；
4. 陶土板幕墙龙骨进场安装施工完成 20%；
5. 实验室地面垫层：A 座四层施工完成，三层施工完成 30%；B 座五层施工完成，六层施工完成 50%；
6. 机电专业同步进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；


三、本周协调工作情况

1. 2023年4月6日，组织设计、监理、施工单位查看现场施工情况，沟通解决各专业技术问题；

四、本周主要大事记

1. 2023年4月6日，区住建委组织召开施工现场扬尘管理工作部署会；
2. 2023年4月6日，组织设计、监理、施工单位查看现场施工情况，沟通解决各专业技术问题；
3. 2023年4月7日，区人社局组织召开保障农名工工资支付培训暨工作部署会议；
4. 2023年4月9日，区住建委组织召开施工现场安全管理工作会议；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。


五、现场检查及施工照片

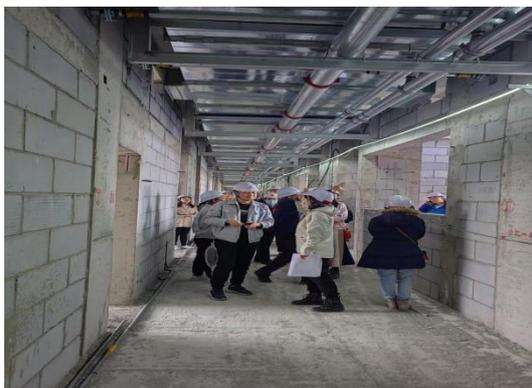

质量联合检查



技术专题会议

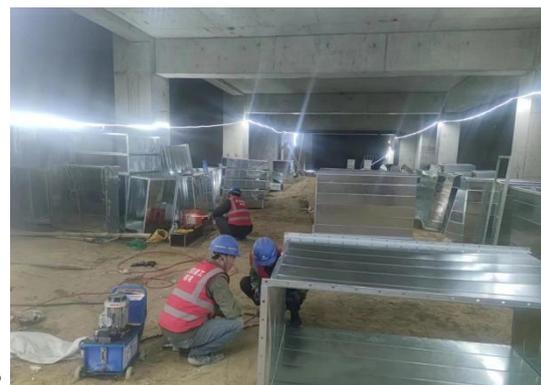

安全联合检查



地面垫层施工

通风管道加工



埋件打孔安装
