

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 14 期

校园建设处

2023 年 5 月 1 日

一、本周现场情况

1. 地下室顶板涂料防水施工完成，卷材防水施工完成 25%；
2. 消防水池顶板防水施工完成；
3. B 座首层房心回填土施工完成 40%；
4. 室内公共区域地面垫层：A 座 5-6 层施工完成；B 座 6-7 层施工完成；
5. 陶土板幕墙龙骨：A 座现场加工完成 30%；B 座进场 5%；
6. 屋面保温施工完成 60%；
7. 外圈脚手架拆除施工完成 50%；
8. 机电专业进行强、弱电管线、给排水、采暖、风管等预留预埋安装。

二、下周工作计划

1. 地下室顶板卷材防水施工完成 40%；
2. 屋面保温施工完成 70%，屋面机房层卷材防水施工完成；
3. 外圈脚手架拆除施工完成 70%；吊篮安装完成 5%；
4. 陶土板幕墙龙骨：A 座加工完成 40%，B 座进场 15%；
5. B 座房心回填土施工完成 75%；东侧汽车坡道、基坑肥槽回填完成；
6. 室内公共区域地面垫层：A 座 3-4 层施工完成；B 座 4-5 层施工完成；

7. 机电专业进行强、弱电管线、排水、采暖、风管等预埋预留安装；

三、本周协调工作情况

无


四、本周主要大事记

1. 2023年4月25日，参加区建委、消防救援支队组织召开的安全生产专项整治深化年行动暨消防安全标准化管理会议；
2. 2023年4月25日，组织项目参建各方进行五一节前安全联合大检查；
3. 2023年4月26日，参加北京市专家组对现场绿色安全样板工地进行二次验收；
4. 2023年4月28日，参加区建委组织召开的安全生产例会暨五一假期安全管理工作部署会议；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

五、现场检查及施工照片



安全样板工地验收

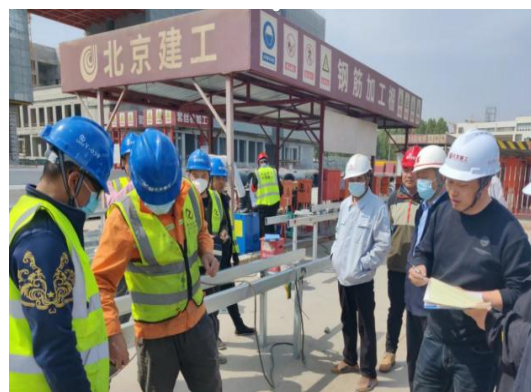

节前安全联合检查



幕墙龙骨加工



外脚手架拆除



机电专业施工



房心回填土施工
