

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 15 期

校园建设处

2023 年 5 月 8 日

一、本周现场情况

1. 地下室顶板卷材防水施工完成 25%；
2. 屋面机房层顶板防水施工完成 60%；
3. B 座首层房心回填土施工完成 60%；
4. 东侧汽车坡道和消防水池部位回填土施工完成；
5. 陶土板幕墙龙骨：A 座现场加工完成 40%；B 座进场 10%；
6. 屋面保温层施工完成 80%；
7. 脚手架拆除施工完成 80%；吊篮开始安装；
8. 机电专业进行强、弱电管线、给排水、采暖、风管等预留预埋安装。

二、下周工作计划

1. 地下室顶板卷材防水施工完成 50%；
2. 屋面保温层施工完成 90%，屋面机房层顶板防水施工完成；
3. 脚手架拆除施工完成；吊篮安装完成 20%；
4. 陶土板幕墙龙骨：A 座加工完成 50%，B 座进场 20%；
5. B 座房心回填土施工完成；内圈基坑肥槽回填土施工完成；
6. B 座 3-6 层走廊及室内装饰基层施工；

7. 机电专业进行强、弱电管线、排水、采暖、风管等预埋预留安装；

三、本周协调工作情况

1. 2023年5月6日，组织参建各方现场讨论有关室外管线、道路、回填土及标高等事宜，协调设计院配合完成外线施工图纸等；

四、本周主要大事记

1. 2023年5月6日，组织参建各方现场讨论有关室外管线、道路、回填土及标高等事宜，协调设计院配合完成外线施工图纸等；

2. 2023年5月6日，参加区建委组织召开的现场检查标准培训会议；

3. 2023年5月6日，参加市建委组织召开的紧急安全会议；

4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。



五、现场检查及施工照片



现场讨论图纸问题



安全联合检查

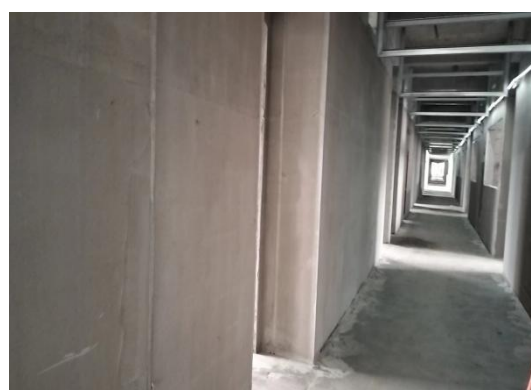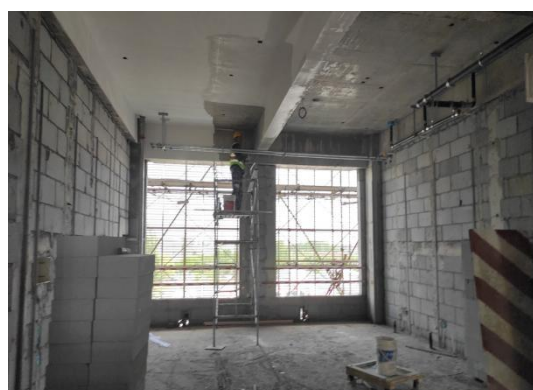

室内顶面装饰施工



室内墙面基层施工



屋面机房防水施工

外脚手架拆除
