

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 21 期

校园建设处

2023 年 6 月 19 日

---

### 一、本周现场情况

1. 屋面防水施工完成 20%；
2. A 座首层房心回填土施工完成 40%；
3. 地下室二次结构砌筑施工完成 5%；
4. 室内装饰: 室内墙面基层施工完成 30%，顶板基层施工完成 40%；
5. 陶土板幕墙龙骨加工完成 90%，安装完成 85%；
6. 吊篮安装完成 90%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 屋面防水施工完成 40%；
2. B 座首层地面垫层施工完成 40%；
3. 地下室二次结构施工完成 30%；
4. A 座首层房心回填土施工完成；
5. 陶土板幕墙龙骨加工完成 95%，安装完成 85%；
6. 室内装饰: 墙面基层施工完成 35%，顶板基层施工完成 45%；
7. 吊篮安装完成 95%；

8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

1. 2023年6月14日，组织设计、施工、监理单位对室内装修相关内容进行讨论，并对装修材料进行选样封样，督促施工单位按照会议要求积极配合推进装修方案确认；
2. 2023年6月15日，组织设计、施工、监理单位同教务处领导查看二层房间现状，推进现场工程施工进度；
3. 2023年6月17日，拱辰街道城市综合管理局组织召开安全文明施工等交底；

### 四、本周主要大事记

1. 2023年6月14日，组织设计、施工、监理单位对室内装修相关内容进行讨论，并对装修材料进行选样封样，督促施工单位按照会议要求积极配合推进装修方案确认；
2. 2023年6月15日，组织设计、施工、监理单位同教务处领导查看二层房间现状，推进现场工程施工进度；
3. 2023年6月17日，拱辰街道城市综合管理局组织召开安全文明施工等交底；
4. 2023年6月17日，区建委组织召开安全生产紧急会议；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

## 五、现场检查及施工照片



装饰材料选样




工程安全大检查



工程质量进度检查



设备开箱检验

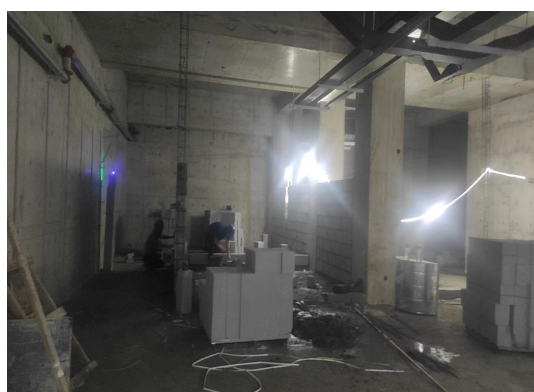

地下室砌筑施工



幕墙龙骨安装
