

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 20 期

校园建设处

2023 年 6 月 12 日

一、本周现场情况

1. 屋面防水施工完成 15%；
2. 钢结构连廊防火涂料施工完成；
3. 地下室地面施工完成 20%；
4. A 座首层房心回填土施工完成 20%；
5. 室内装饰: 室内墙面基层施工完成 25%，顶板基层施工完成 35%；
6. 陶土板幕墙龙骨加工安装：
A 座现场加工完成 85%，B 座龙骨进场 60%；
内圈安装完成 85%，外圈安装完成 50%；
7. 吊篮安装完成 85%；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面防水施工完成 20%；
2. 地下室地面施工完成 25%；
3. 地下室二次结构施工完成 20%；
4. A 座首层房心回填土施工完成 40%；

5. 陶土板幕墙龙骨加工安装：

A 座现场加工完成 95%，B 座龙骨加工进场 70%；

内圈安装完成 90%，外圈安装完成 60%；

6. 室内装饰：墙面基层施工完成 30%，顶板基层施工完成 40%；

7. 吊篮安装完成 90%；

8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 6 月 8 日，组织施工单位查看阜成路校区数字未来中心与实验室；

2. 2023 年 6 月 8 日，组织设计、施工、监理召开现场室外工程图纸技术讨论会议，解决各专业制约问题；

3. 2023 年 6 月 11 日，组织施工、监理单位对装修设计方案进行讨论，督促施工单位完善室内装修相关内容，积极推进装修方案确认；

四、本周主要大事记

1. 2023 年 6 月 8 日，组织施工单位查看阜成路校区数字未来中心与实验室；

2. 2023 年 6 月 8 日，组织设计、施工、监理召开室外工程图纸技术讨论会议；

3. 2023 年 6 月 11 日，组织施工、监理单位对装修设计方案进行讨论；

4. 2023 年 6 月 8 日，市建委组织召开房建市政工程领域大排查大整治安全生产专题培训会议；

5. 2023年6月9日，组织施工、监理单位对防汛物资储备进行检查，组织参建各方进行防汛应急演练，提高汛期现场应急抢险和处置能力；
6. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。


五、现场检查及施工照片




室外工程推进会议




安全大检查

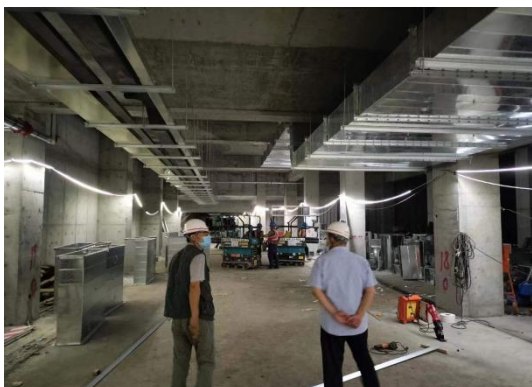

机电专业施工

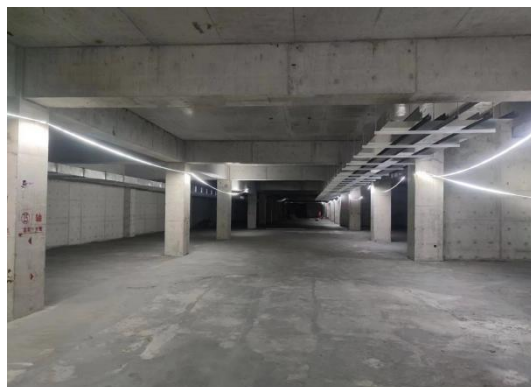

地下室地面施工

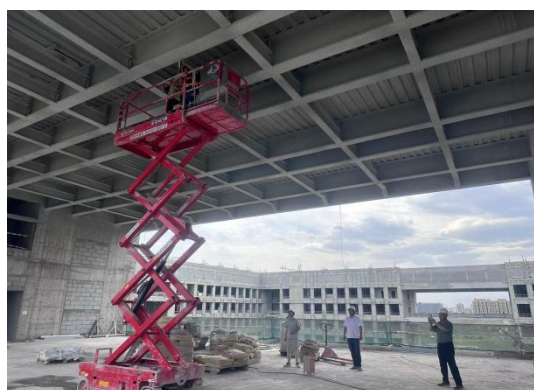

防火涂料施工



幕墙龙骨安装
