

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 25 期

校园建设处

2023 年 7 月 17 日

一、本周现场情况

1. 屋面防水施工完成 80%；
2. 外窗部分铝型材进场，窗洞放线，钢框材加工安装；
3. 室内装饰: 室内墙面基层施工完成 50%，顶板基层施工完成 60%；
4. 外墙保温岩棉施工完成 15%；
5. 钢连廊底部吊顶龙骨安装完成 90%；
6. 中庭外线雨水管施工完成 10%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面防水施工完成；
2. 外墙保温岩棉施工完成 30%，陶土板安装完成 5%；
3. 室内装饰: 墙面基层施工完成 55%，顶板基层施工完成 65%；
4. 外窗钢框材加工安装；
5. 东连廊玻璃幕墙龙骨加工完成 80%，安装完成 50%；凹廊埋件安装完成 50%；
6. 中庭外线雨水管施工完成 20%；

7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023年7月11日，沟通房山区良泉水业公司，协调工程计划科到现场指定给水接驳位置事宜；

2. 2023年7月13日，市人防主管部门莅临现场指导工作；

四、本周主要大事记

1. 2023年7月11日，沟通房山区良泉水业公司，协调工程计划科到现场指定给水接驳位置事宜；

2. 2023年7月13日，市人防主管部门莅临现场指导工作；

3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片




人防工程验收



进度检查



安全检查

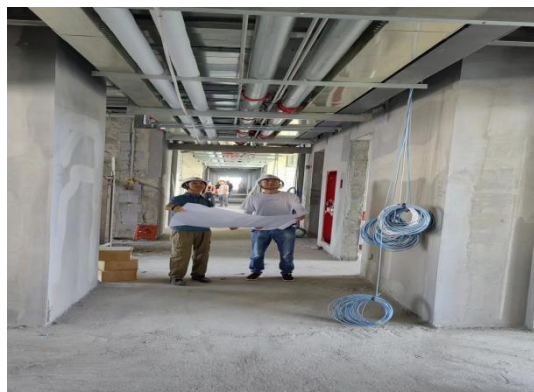

质量检查



室内装饰施工



室外管线施工
