

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 26 期

校园建设处

2023 年 7 月 24 日

一、本周现场情况

1. 屋面防水施工完成 85%；
2. 外窗框安装完成 5%；
3. 室内装饰: 室内墙面基层施工完成 80%，顶板基层施工完成 80%；
4. 陶土板幕墙龙骨安装加固，保温岩棉施工完成 20%；
5. 钢连廊底部吊顶龙骨安装完成，底部保温施工完成 30%；
6. 室外雨水管线施工完成 20%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面防水施工完成；
2. 外墙保温岩棉施工完成 40%；
3. 室内装饰: 墙面施工完成 10%，顶板施工完成 10%；
4. 外窗框安装完成 20%；
5. 东连廊处玻璃幕墙主龙骨安装完成 70%；
6. 中庭室外弱电管线施工完成；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023年7月21日，区建委组织召开施工现场防汛部署会议；
2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片




核查图纸与现场情况



防汛检查



安全检查

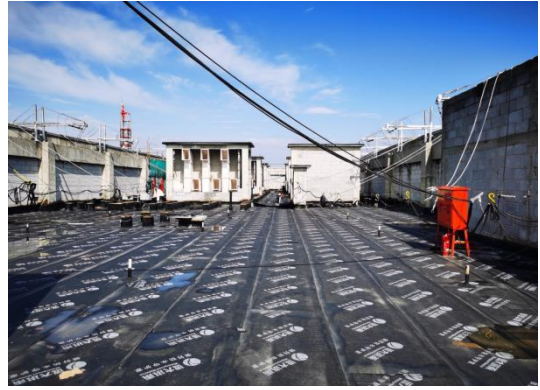

屋面防水施工



外窗框安装



室外管线施工
