

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 34 期

校园建设处

2023 年 9 月 18 日

一、本周现场情况

1. 陶土板安装完成 80%；
2. 外窗安装完成 60%；
3. 玻璃幕墙安装完成 20%；
4. 室内地面水磨石施工完成 80%；
5. 首层石材安装完成 20%；
6. 地下室地面工程施工完成 90%；
7. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 陶土板安装完成 90%；
2. 外窗安装完成 70%；
3. 玻璃幕墙安装完成 25%；
4. 室内水磨石地面施工完成 90%；
5. 首层石材安装完成 30%；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；

7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。


三、本周协调工作情况

1. 2023年9月13日，组织设计院到场解决工程技术问题；
2. 2023年9月15日，组织外电源施工单位查看现场施工情况，协调施工单位为外电源施工做好场地移交工作。

四、本周主要大事记

1. 2023年9月14日，区建委组织召开施工管理工作会，传达9月14日上午“全市加强施工动火安全防范工作紧急会”会议精神，部署施工动火作业防范工作；
2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片

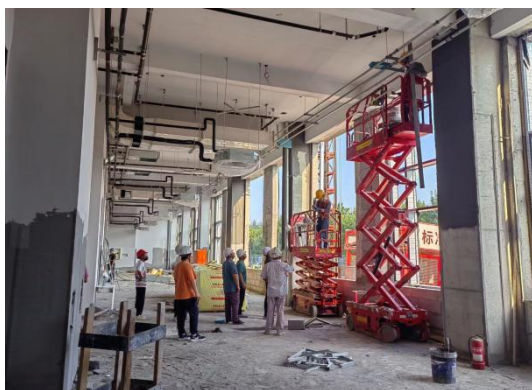

安全联合检查



讨论工程技术问题



协调施工场地移交



机电专业施工



玻璃幕墙施工



室外管线施工
