

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 33 期

校园建设处

2023 年 9 月 11 日

---

### 一、本周现场情况

1. 陶土板安装完成 65%，岩棉施工完成 90%；
2. 外窗框安装完成 80%，玻璃安装完成 30%；
3. 连廊下铝板吊顶安装完成 90%，幕墙玻璃安装完成 5%；
4. 室内地面水磨石施工完成 60%；
5. 地下室无机纤维保温施工完成；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 陶土板安装完成 75%；
2. 外窗框安装完成 90%，玻璃安装完成 40%；
3. 室内地面水磨石施工完成 80%；
4. 连廊幕墙玻璃安装完成 10%；
5. 地下室地面工程施工完成 60%；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

无

### 四、本周主要大事记

1. 2023年9月8日，区建委组织召开施工管理工作会，传达市区安全生产和火灾隐患大排查大整治第二十七次调度会会议精神，部署强降雨应对防范工作。
2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

### 五、现场检查及施工照片




安全联合检查



水磨石地面施工



机电专业施工

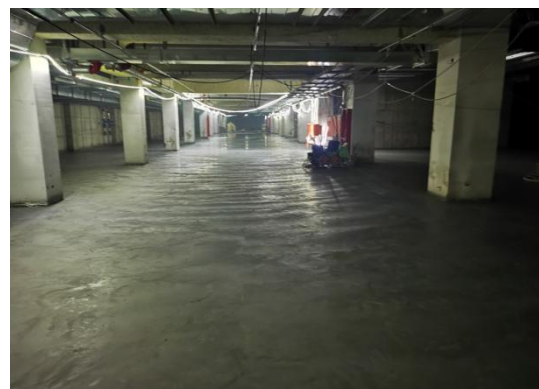

地下室地面施工



陶板、外窗施工



室外管线施工
