

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 30 期

校园建设处

2023 年 8 月 21 日

一、本周现场情况

1. 屋面工程施工完成 85%；
2. 陶土板安装完成 20%，岩棉施工完成 40%，外窗框安装完成 40%；
3. 室内地面水磨石施工完成 10%；
4. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 85%；
5. 地下室无机纤维保温施工完成 60%；
6. 室外雨污水、弱电管线施工完成 20%，热力管线施工完成 20%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 屋面工程施工完成 90%；
2. 陶土板安装完成 30%，岩棉施工完成 60%；外窗框安装完成 45%；
3. 室内地面水磨石施工完成 20%；
4. 连廊玻璃幕墙龙骨安装完成 90%，连廊下铝板吊顶开始安装；
5. 地下室无机纤维保温施工完成 80%；
6. 室外雨污水、弱电管线施工完成 30%，热力管线施工完成 50%；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023年8月17日，组织设计、监理、施工单位查看现场施工样板及讨论相关技术问题；

四、本周主要大事记

1. 2023年8月15日，组织参建各方对现场进行消防联合检查；
2. 2023年8月17日，组织设计、监理、施工单位查看现场施工样板及讨论相关技术问题；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片




工程技术讨论会议



材料比选封样



安全联合检查

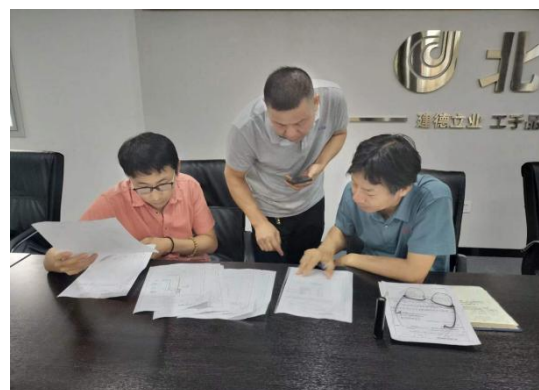

审核变更洽商情况



室外管线施工



陶板幕墙施工
