

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 32 期

校园建设处

2023 年 9 月 4 日

---

### 一、本周现场情况

1. 陶土板安装完成 50%，岩棉施工完成 80%；
2. 外窗框安装完成 70%，玻璃安装完成 20%；
3. 连廊下铝板吊顶安装完成 80%，幕墙玻璃开始安装；
4. 室内地面水磨石施工完成 40%；
5. 地下室无机纤维保温施工完成 90%；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 陶土板安装完成 60%，岩棉施工完成 90%；
2. 外窗框安装完成 80%，玻璃安装完成 30%；
3. 室内地面水磨石施工完成 50%；
4. 连廊幕墙玻璃安装完成 10%，连廊下铝板吊顶安装完成；
5. 地下室无机纤维保温施工完成；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

1. 2023年8月30日，组织设计院到场解决工程问题并对相关材料进行选样确认；

### 四、本周主要大事记

1. 2023年8月30日，组织设计院到场解决工程问题并对相关材料进行选样确认；
2. 2023年8月31日，区建委组织召开建设工程8月份安全生产视频会议，通报督查检查情况，部署近期重大活动保障工作；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

### 五、现场检查及施工照片



材料比选确认



窗台板、内窗套




安全联合检查



室内施工情况



陶板、外窗施工

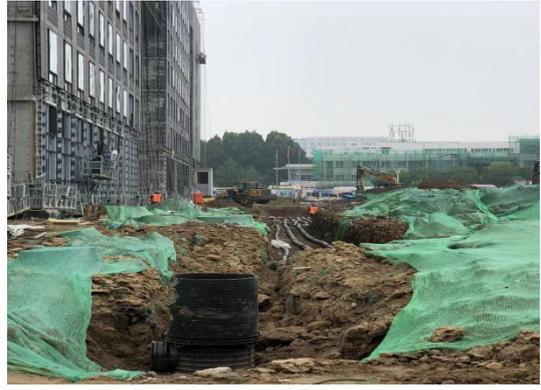

室外管线施工
