

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 38 期

校园建设处

2023 年 10 月 16 日

一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 5%；
2. 首层石材安装完成 60%；
3. 外窗安装完成 90%，窗台板安装完成 70%，铝窗套安装完成 20%；
4. 玻璃幕墙安装完成 55%；
5. 室内：墙面施工完成 60%，地面施工完成 80%，窗帘盒安装完成 60%；
5. 卫生间墙地砖粘贴完成 20%；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 首层石材安装完成 70%，汽车坡道出入口装饰施工完成 10%；
2. 外窗安装完成 95%，窗台板安装完成 80%，铝窗套安装完成 40%；
3. 室内：墙面施工完成 65%，地面施工完成 85%，窗帘盒安装完成 70%；
4. 卫生间墙地砖粘贴完成 40%；

- 5 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
6. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 10 月 12 日，组织设计院、监理、施工单位、审计单位参会，召开施工现场技术工作协调会和工程进度推进会；

四、本周主要大事记

1. 2023 年 10 月 10 日，区住建委组织召开会议，传达市、区燃气安全工作调度会会议精神，传达市、区大气污染防治工作会议精神以及市、区领导关于安全生产、扬尘治理工作要求，部署全区施工现场“一带一路”高峰论坛服务保障工作以及安全生产、扬尘治理、违规电动三四轮车综合治理工作等；
2. 2023 年 10 月 12 日，组织设计院、监理、施工单位、审计单位参会，召开施工现场技术工作协调会和工程进度推进会；
3. 2023 年 10 月 13 日，市、区住建委组织召开全市住建系统安全生产工作紧急会议，部署重要会议期间安全生产和绿色施工管理工作；
4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片



工程进度、技术会议



安全联合检查




陶板幕墙施工



机电专业施工



卫生间砖铺贴

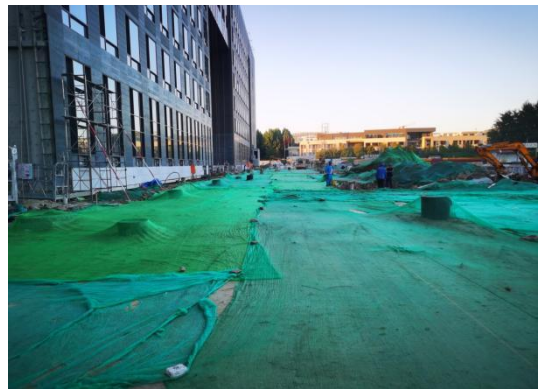

室外工程施工
