

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 36 期

校园建设处

2023 年 10 月 2 日

一、本周现场情况

1. 陶土板安装完成 95%，首层石材安装完成 45%；
2. 外窗安装完成 80%，玻璃幕墙安装完成 45%；
3. 室内：墙面施工完成 50%，地面施工完成 70%，吊顶工程施工完成 20%；
4. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
5. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 陶土板安装完成，首层石材安装完成 65%；
2. 外窗安装完成 90%，玻璃幕墙安装完成 60%；
3. 室内：墙面施工完成 55%，地面施工完成 75%，吊顶工程施工完成 25%；
4. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
5. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023年9月27日，组织参建各方进行国庆、中秋假期节前安全联合大检查；
2. 2023年10月1日，校领导莅临现场检查指导工作；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。


五、现场检查及施工照片



校领导现场指导工作



安全联合大检查

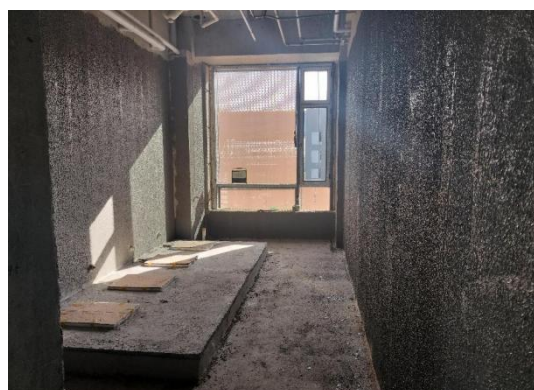

卫生间施工



走廊公区施工



玻璃幕墙施工



室外管线施工
