

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 41 期

校园建设处

2023 年 11 月 6 日

一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 50%；
2. 首层石材安装完成 90%；
3. 玻璃幕墙安装完成 85%；
4. 室内施工：墙面完成 75%，地面完成 95%，窗帘盒安装完成 85%；
5. 卫生间墙地砖粘贴完成 80%；
6. 公区地砖粘贴：走廊施工完成 20%，楼梯施工完成 30%；
7. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 首层石材安装完成 95%，汽车坡道出入口装饰施工完成 60%；
2. 玻璃幕墙安装完成 90%；
3. 室内施工：墙面完成 80%，窗帘盒安装完成 90%；
4. 卫生间墙地砖粘贴施工完成 90%；
5. 楼梯栏杆施工完成 5%，防火门、窗施工完成 5%；
6. 公区地砖粘贴：走廊施工完成 30%，楼梯施工完成 45%；

7. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施

8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023年10月31日，校领导莅临现场指导工作；

2. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。


五、现场检查及施工照片



校领导莅临指导工作



安全联合检查

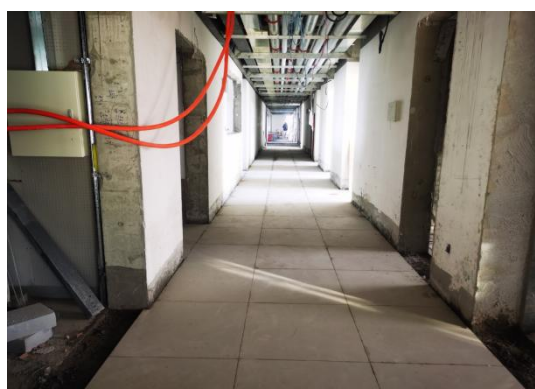

走廊贴砖施工



机电专业施工



汽车坡道装饰施工



室外工程施工
