

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 43 期

校园建设处

2023 年 11 月 20 日

一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 80%；
2. 玻璃幕墙安装完成 95%，首层出入口雨棚、门完成 20%；
3. 室内施工：墙面完成 85%，窗帘盒安装完成 95%，吊顶完成 30%；
4. 楼梯栏杆施工完成 30%，防火门、窗、卷帘安装完成 5%；
5. 卫生间吊顶施工完成 35%；
6. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 70%，楼梯完成 70%，大厅完成 50%；
7. 大厅装饰装修施工完成 30%；
8. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
9. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 90%；
2. 室内施工：墙面完成 90%，吊顶完成 60%；
3. 卫生间吊顶施工完成 60%；
4. 首层出入口雨棚、门完成 40%；
5. 楼梯栏杆施工完成 60%，防火门、窗、卷帘施工完成 20%；

6. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 80%，楼梯完成 80%，大厅完成 65%；
7. 大厅装饰装修施工完成 40%；
8. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施
9. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无


四、本周主要大事记

1. 2023 年 11 月 16 日，市建委对施工现场进行安全、质量检查；
2. 2023 年 11 月 17 日，区建委组织召开施工工地调度会及冬季施工培训训会；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片




安全联合检查

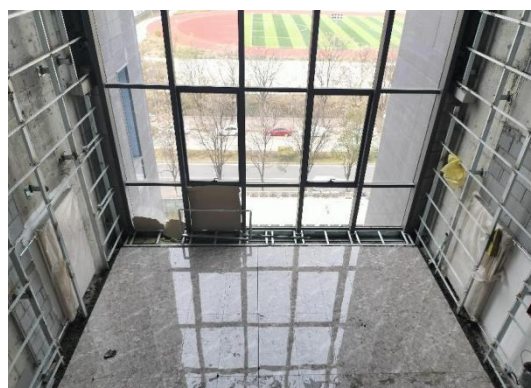


大厅装饰装修



室内吊顶施工

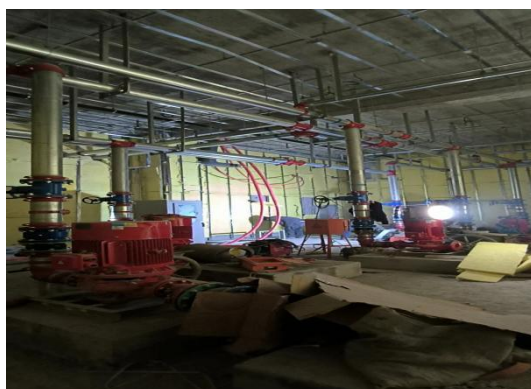

机电专业施工

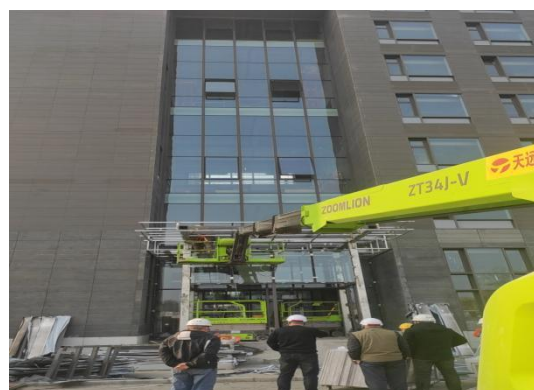

雨棚、门斗施工



室外工程施工
