

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 44 期

校园建设处

2023 年 11 月 27 日

一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 90%；
2. 首层出入口雨棚、门完成 40%；
3. 室内施工：墙面完成 90%，吊顶完成 65%，木门安装完成 5%；
4. 楼梯栏杆施工完成 50%，防火门、窗、卷帘安装完成 15%；
5. 卫生间吊顶施工完成 60%；
6. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 85%，楼梯完成 85%，大厅完成 65%；
7. 大厅装饰装修施工完成 40%；
8. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
9. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成；
2. 室内施工：吊顶完成 80%，木门安装完成 30%；
3. 卫生间吊顶施工完成 85%；
4. 首层出入口雨棚、门完成 60%；
5. 楼梯栏杆施工完成 80%，防火门、窗、卷帘施工完成 40%；

6. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 90%，楼梯完成 90%，大厅完成 80%；
7. 大厅装饰装修施工完成 50%；
8. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施
9. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023 年 11 月 20 日，区建委对施工现场进行安全、质量检查；
2. 2023 年 11 月 21 日，区建委组织召开的冬季安全施工会议；
3. 2023 年 11 月 24 日，区建委组织召开施工工地调度会；
4. 2023 年 11 月 25 日，组织参建单位进行消防专项安全联合大检查；
5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。


五、现场检查及施工照片




安全联合检查



大厅装饰装修

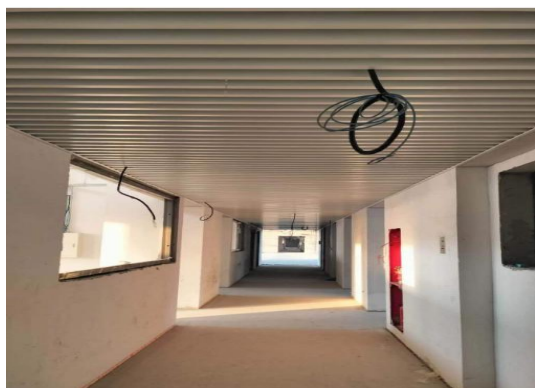

走廊吊顶施工

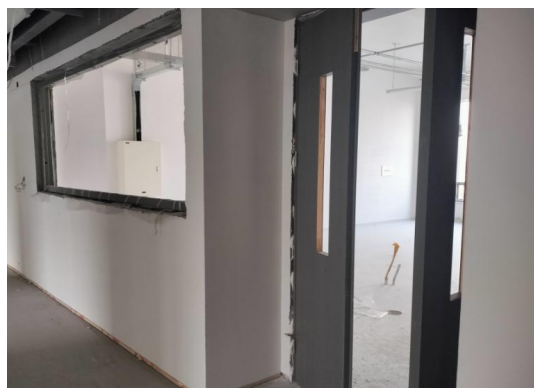

木门、内窗安装



雨棚、门斗施工



室外工程施工
