

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 45 期

校园建设处

2023 年 12 月 4 日

---

### 一、本周现场情况

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 85%；
2. 室内墙、地面及吊顶施工完成 90%，木门安装完成 40%；
3. 卫生间吊顶施工完成 85%；
4. 楼梯栏杆施工完成 80%，防火门、窗、卷帘安装完成 40%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 90%，楼梯完成 90%，大厅完成 80%；
6. 大厅装饰装修施工完成 50%；
7. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 二、下周工作计划

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 90%；
2. 室内墙、地面、吊顶施工完成 95%，木门安装完成 80%；
3. 卫生间吊顶施工完成 90%；
4. 楼梯栏杆施工完成 90%，防火门、窗、卷帘施工完成 60%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊完成 95%，楼梯完成 95%，大厅完成 85%；

6. 大厅装饰装修施工完成 70%；
7. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

### 三、本周协调工作情况

1. 2023 年 11 月 28 日，组织设计院、施工、监理单位对现场装饰装修施工进行现场技术讨论；
2. 2023 年 12 月 1 日，组织对实验室内各级配电箱进行安全用电检查，做好电气火灾预防工作；

### 四、本周主要大事记

1. 2023 年 11 月 27 日，市教委领导莅临现场检查指导工作；
2. 2023 年 11 月 28 日，组织监理、施工单位对现场进行安全、消防、文明施工联合大检查；
3. 2023 年 11 月 30 日，市住建委组织召开 11 月份安全生产例会；
4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

## 五、现场检查及施工照片




领导莅临检查指导




现场技术讨论会



安全联合检查

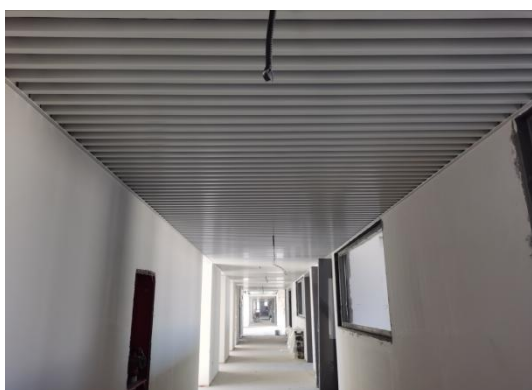

走廊装饰施工

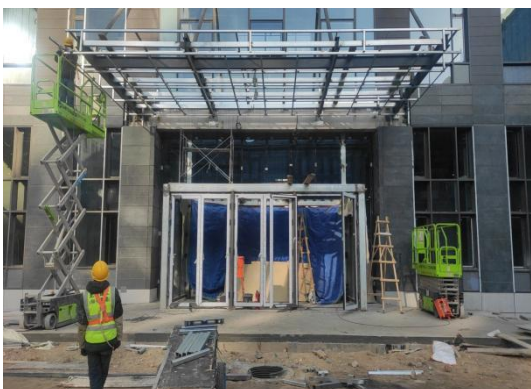

雨棚、门斗施工



室外工程施工
