

北京工商大学良乡校区二期新建工程

施工周报

2020年第9期

校园建设处

2020年6月13日

16-02-01 地块学生食堂和学生活动中心

一、工作计划完成情况

屋面工程：女儿墙及机房层外立面真石漆开始喷涂。

室内装修工程：室内木地板施工，防火门安装，墙面石材安装完成，楼梯面砖安装完成。

机电专业安装工程：一至三层灯具安装及调试，电气插座安装，二层喷淋追位及消火栓安装，空调面板安装。

外线：北区室外管道铺设，下沉小院施工。南区道路及路面施工。

二、工作计划未完成情况及原因

无

三、问题解决情况

无


四、下周工作计划

学生食堂和学生活动中心装修工程、给排水、暖通、电气等专业继续施工，屋面施工，下沉小院继续施工；南区运动场塑胶及草皮施工，道路及路面砖施工。


五、其他

无。

六、施工现场情况

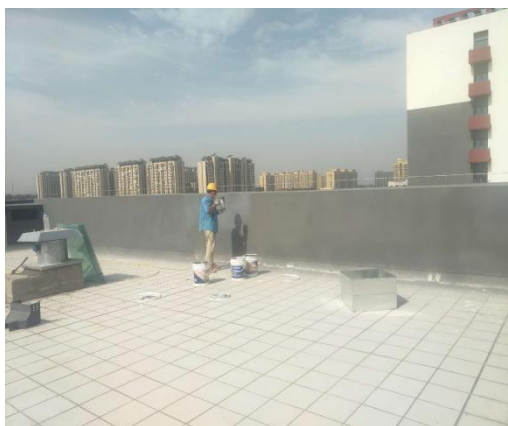

屋面施工

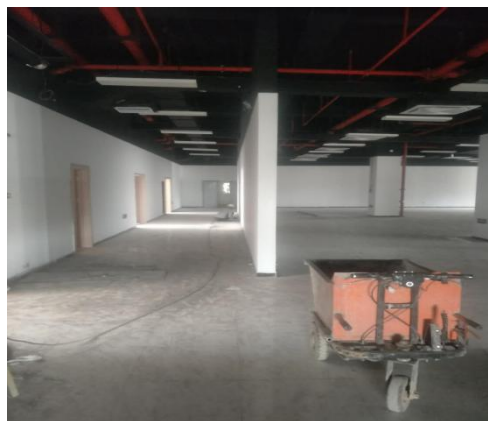

室内施工



南区道路施工



室外管线施工

编制人:吴竟熙 审核人:刘隽飞、于子福 终审:付仕伦
