

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2021 年第 2 期

校园建设处

2021 年 11 月 29 日


一、本周施工现场完成情况

1. 生活区宿舍施工，现场消防水及生产用水管道敷设，实验室基础施工完成，生活区混凝土地面浇筑完成 70%，大门外道路混凝土地面浇筑完成，按照计划完成。

2. 场区内 34 口疏干井全部施工完成，三轴搅拌机进场组装完成，止水帷幕完成 50 幅，按照计划完成。

二、下周工作计划

计划完成止水帷幕 150 幅，累计完成 200 幅。

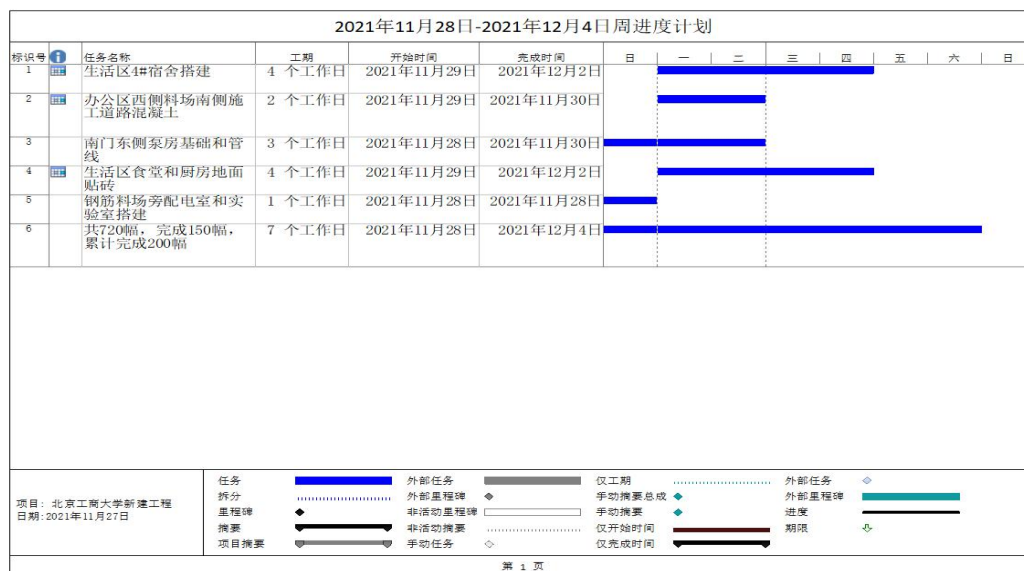

三、本周协调工作情况

1. 完成地下管线资料移交工作。
2. 协调施工、监理单位准备上交房山区质量监督站相关文件。

四、本周项目主要大事记

11月22日下午召开监理会。

11月24日下午，拱辰街道城建科来现场检查工作，签订施工现场扬尘治理专项检查（验收）表及施工安全监督及管理抽查记录单。

11月24日下午，市教委基建处、市发改委京津冀协同专班办公室视察工作。

11月26日下午，房山区质监站对项目进行质量交底，切实履行各方主体责任。

五、现场检查及施工照片



市教委及发改委视察工作



拱辰街道视察工作



质监站首次监督及交底



三轴搅拌机安装完成



生活区路面硬化



疏干井施工
