

北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 39 期

校园建设处

2023 年 10 月 23 日

一、本周现场情况

1. 汽车坡道出入口装饰施工完成 10%；
2. 首层石材安装完成 70%；
3. 外窗安装完成 95%，窗台板安装完成 80%，铝窗套安装完成 60%；
4. 玻璃幕墙安装完成 75%；
5. 室内施工：墙面完成 65%，地面完成 85%，窗帘盒安装完成 70%；
5. 卫生间墙地砖粘贴完成 30%；
6. 室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1. 首层石材安装完成 85%，汽车坡道出入口装饰施工完成 30%；
2. 窗台板安装完成 90%，铝窗套安装完成 70%；
3. 室内施工：墙面完成 70%，地面完成 90%，窗帘盒安装完成 80%；
4. 卫生间墙地砖粘贴施工完成 50%；
5. 公区地砖粘贴：走廊施工完成 10%，楼梯完成 5%；

6. 室外雨、污、中、给水、道路和热力管线开挖、敷设、回填等施工；
7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无

四、本周主要大事记

1. 2023年10月17日，校领导莅临检查指导工作；
2. 2023年10月18日，区住建委组织召开房山区建设工程第一轮专项治理检查情况通报会；
3. 2023年10月20日，组织监理、施工单位对现场安全、质量和进度进行专项检查；
4. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片



校领导莅临指导工作



工程联合大检查



2




室内装饰施工



玻璃幕墙、雨棚施工

机电专业施工

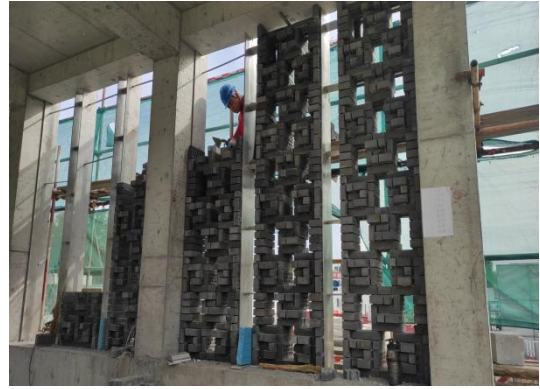

汽车坡道装饰施工
