

# 北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

## 施工周报

2023 年第 47 期

校园建设处

2023 年 12 月 18 日

---

### 一、本周现场情况

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 90%；
2. 室内墙、地面及吊顶施工完成，木门安装完成 85%；
3. 卫生间吊顶施工完成；
4. 楼梯栏杆施工完成，防火门、窗、卷帘安装完成 80%；
5. 公区地砖粘贴施工：走廊、楼梯完成，大厅完成 95%；
6. 大厅装饰装修施工完成 85%；
7. 室外雨、给水、道路，开挖、敷设、回填等施工；
8. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水等安装。

### 二、下周工作计划

1. 首层主次出入口门、雨棚、门斗施工完成 95%；
2. 室内木门安装完成 95%；
3. 防火门、窗、卷帘施工完成 95%；
4. 公区地砖粘贴施工完成；
5. 大厅装饰装修施工完成 95%；
6. 室外雨、给水、道路，开挖、敷设、回填等施工；

7. 机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水等安装。

### 三、本周协调工作情况

无


### 四、本周主要大事记

1. 2023年12月13日，区建委召开施工工地降雪寒潮调度会议；
2. 2023年12月15日，区建委召开施工工地调度会，部署重点工作；
3. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。


### 五、现场检查及施工照片



安全检查会议

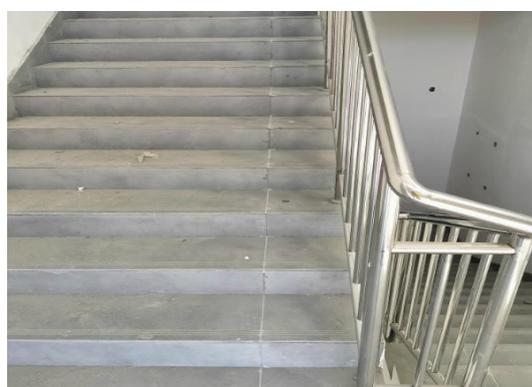

楼梯栏杆安装

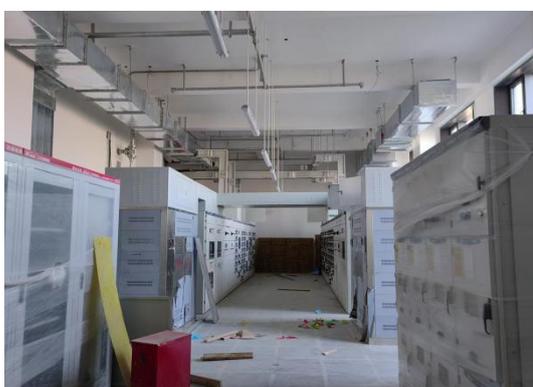

配电室施工



电梯厅装饰施工



屋面新风设备



室外工程施工
