北京工商大学良乡校区 AB 座教学科研楼

施工周报

2023 年第 10 期

校园建设处　　2023 年 4 月 3 日

一、本周现场情况

1. 东西两侧汽车坡道外墙防水施工完成；

2. 二次结构砌筑：A 座施工完成 85%，B 座施工完成 90%；

3. 陶土板幕墙后置埋件打孔安装施工完成 30%；

4. 走廊管综排布及吊顶样板施工完成，卫生间样板施工完成 20%；

5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，给排水、采暖、风管等安装。

二、下周工作计划

1. A 座二次结构砌筑 200m³，B 座二次结构砌筑 100m³；

2. 汽车坡道防水施工完成，A 座首层及消防水池顶板防水施工完成；

3. 二层卫生间样板施工完成 80%；

4. 陶土板幕墙后置埋件打孔安装施工完成 20%；

5. 机电专业同步二次结构进行强、弱电管线预留预埋，排水、采暖、风管等安装；

三、本周协调工作情况

1. 2023 年 3 月 27 日，组织监理单位、施工单位同后勤处研究讨论 AB

座电表增加数据采集功能专题会议；

2. 2023 年 3 月 28 日，同设计单位、监理单位、施工单位考察工人体育场项目安石粉施工工艺质量和效果。

四、本周主要大事记

1. 2023 年 3 月 27 日，组织监理单位、施工单位同后勤处研究讨论 AB 座电表增加数据采集功能专题会议；

2. 2023 年 3 月 28 日，同设计单位、监理单位、施工单位考察工人体育场项目安石粉施工工艺质量和效果；

3. 2023 年 3 月 29 日，参加市建委组织召开的 3 月份安全生产例会；

4. 2023 年 3 月 30 日，房山区领导莅临现场工作调研；

5. 本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施。

五、现场检查及施工照片

区领导现场调研

楼宇电表功能专题会

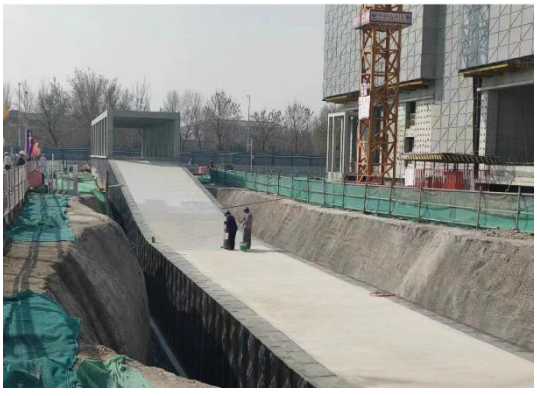

考察工体施工工艺

汽车坡道防水施工

幕墙埋件安装

走廊样板施工
